



Minuta de Visita Técnica-Comercial

José Percovich

Fecha y hora: 5 de marzo de 2026 – 19:15 h

Dirección: Guayaquí 3029, barrio Pocitos, Montevideo

Asistentes:

José Percovich – Cliente

Ing. Nicolás Machín – Voltia

1. Objetivos de la visita

El cliente había recibido previamente una cotización por un sistema de 12 paneles fotovoltaicos elaborada por el asesor comercial Martín García. El objetivo de la visita fue relevar la viabilidad técnica del techo, evaluar la posible ubicación de los equipos del sistema fotovoltaico y responder las consultas técnicas y comerciales del cliente.

2. Observaciones del techo y sistema de montaje

El techo de la vivienda es de hormigón y cuenta con pretilas de altura considerable. Se concluyó que la alternativa más conveniente consiste en instalar una estructura metálica de acero galvanizado por debajo de los paneles, anclada a los pretilas laterales sin perforar la losa de hormigón. La solución proporciona rigidez estructural frente a vientos y evita perforaciones que puedan generar filtraciones. La altura de los pretilas además permite realizar futuras impermeabilizaciones del techo con facilidad.

3. Instalación eléctrica y dimensionamiento del sistema

El suministro eléctrico actual es monofásico con potencia contratada de 6,5 kW. El cliente instalará próximamente una bomba de calor para piscina de aproximadamente 7 kW, por lo que será necesario aumentar la potencia contratada ante UTE. En caso de avanzar con la obra, Voltia puede gestionar este aumento incluyendo la firma técnica requerida.

Se propuso considerar un inversor de 8 kW, permitiendo instalar inicialmente los 12 paneles y dejando margen para ampliar el sistema hasta aproximadamente 16 paneles sin cambiar el inversor.

4. Ubicación de equipos y canalizaciones

Se propone ubicar el inversor y los tableros de protección en el propio techo, detrás de los paneles. Desde allí se realizará la bajada de canalizaciones hacia el frente de la vivienda hasta el nicho donde se encuentra la ICP de UTE.

5. Puesta a tierra

La puesta a tierra del sistema se prevé instalar en el sector delantero de la vivienda, próximo al nicho de UTE, mediante una jabalina conectada al sistema fotovoltaico.

6. Condiciones comerciales comentadas

El cliente manifestó interés en avanzar y propuso una modalidad de pago consistente en 50% al inicio de la obra y 50% financiado directamente con Voltia en algunas cuotas.

7. Pendientes


Pendientes de Voltia

- Verificar dimensiones exactas del techo para confirmar la cantidad de paneles.
- Elaborar plano de implantación del sistema.
- Definir recorrido final de canalizaciones.

Pendientes del cliente

- Confirmar decisión de avanzar con la instalación.

Anexo – Registro fotográfico de la visita

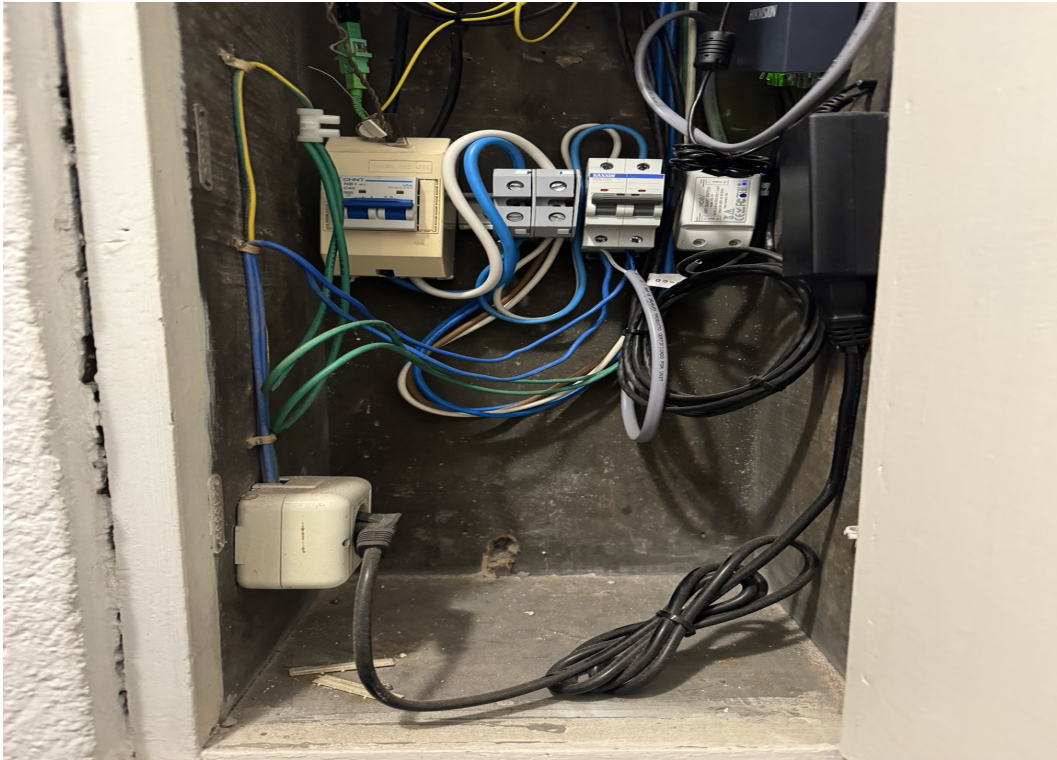

Anexo – Croquis del techo relevado en visita

