



Instalación Fotovoltaica Resumen Técnico

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **Rodolfo Sosa**

Dirección: **Cam. LUSSICH 1374 Sol57**

Ciudad: **Maldonado**

Celular: **096 299 825**

Fecha prevista: **2da semana Abril 26**

DATOS SITIO DE INSTALACIÓN

**Tipo
techo**

- ☐ Isopanel
☐ Hormigón
☒ Chapa
☐ Tejas
☐ Otro:

DATOS ELÉCTRICOS

Cantidad Paneles: **38**

Potencia Paneles: **630W**

Inversor: **Huawei de 25kW**

Strings/Líneas DC: **4**

Cable AC: **Superplastico 4x10mm2**

Térmica AC: **40 A trifásica 4 Polos**

Diferencial AC: **40 A, 300mA 4P**

Largo cables AC (aprox): **40 mts**

Largo cables DC (aprox): **40 mts**

OTROS DATOS

Altura techo: **1 piso**

Red:

- ☐ Monofásica
☐ Trifásica 230 (sin neutro)
☒ Trifásica 400 (con neutro)

Notas:

- La obra civil la hace el cliente a la par del trabajo nuestro. Lo que hacen es lo siguiente:
 - Nicho para el inversor.
 - Canalizaciones de bajada de cables del techo.
 - Zanjas y cámaras de registro.
- En obra civil, Voltia hace:
 - Colocar caños PVC y tender cables.

Techo:



- Es de chapa sobre perfiles C de acero. Van planos adjuntos.
- Montadas con tornillos punta mecha de 12.
- Con el objetivo de evitar perforaciones adicionales en la cubierta, se prioriza la utilización de puntos de fijación existentes correspondientes a tornillos autoperforantes de la chapa.
- Como sellador butilico entre perfil de aluminio y chapa usar PU marca **Würth**


Notas:

En los puntos seleccionados se procede de la siguiente manera:

- 1. Se retira el tornillo existente de fijación de la chapa en la ubicación definida para el montaje.
- 2. Sobre el mismo punto de fijación se instala el perfil de aluminio del sistema fotovoltaico.
- 3. Entre la superficie de la chapa y el perfil de aluminio se coloca material sellador de tipo butílico, el cual permanece permanentemente flexible y permite garantizar la estanqueidad del punto de fijación.
- 4. Posteriormente se reinstala el tornillo autoperforante con arandela de sellado elastomérica, atravesando el perfil de aluminio y comprimiendo el conjunto.
- 5. La compresión del material butílico junto con la arandela de sellado del tornillo genera un sistema de doble sellado que evita la infiltración de agua en la cubierta.



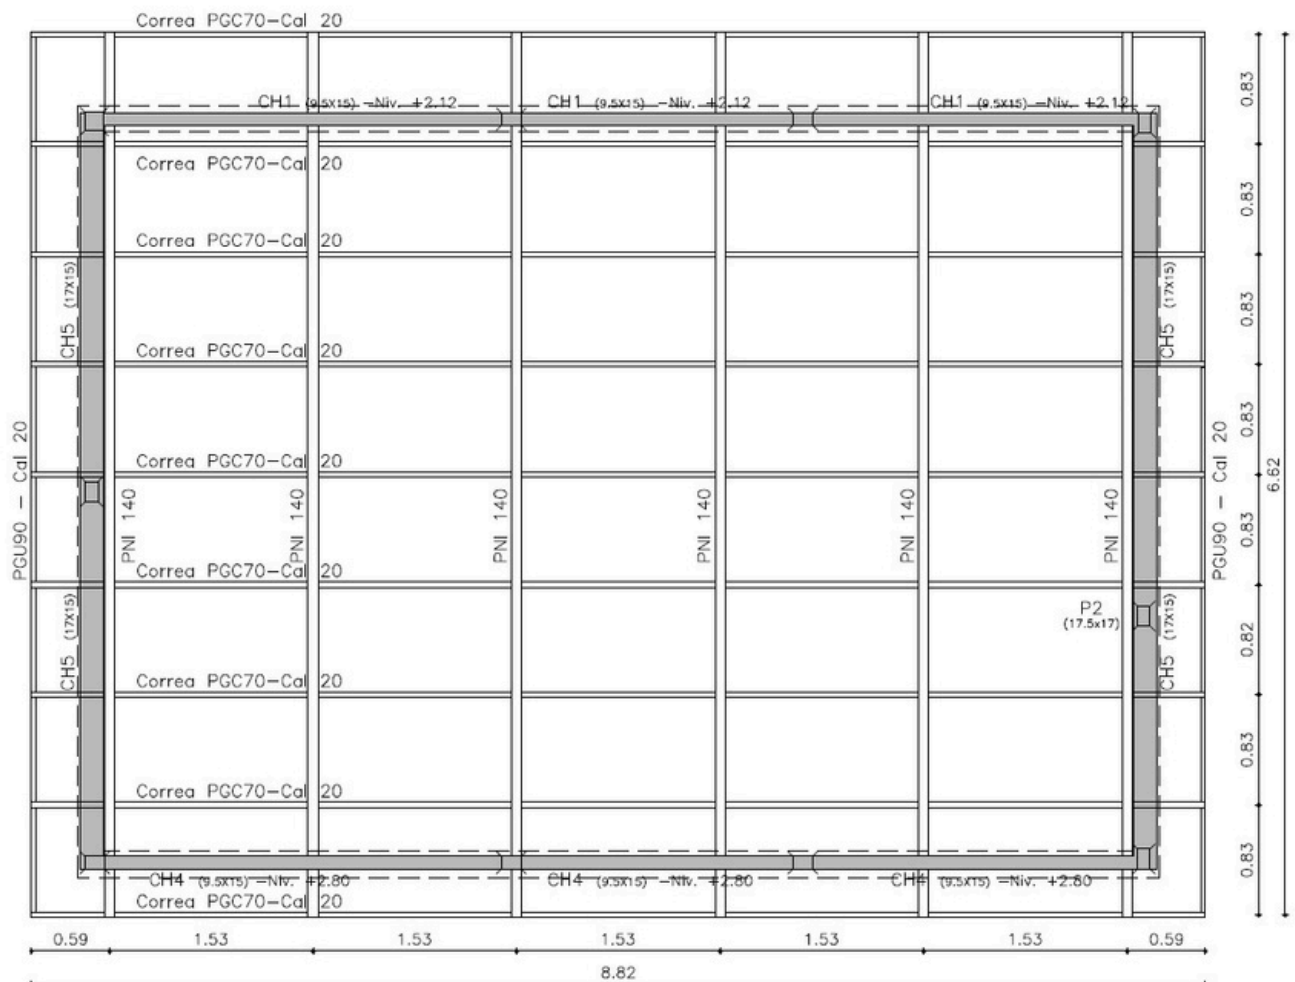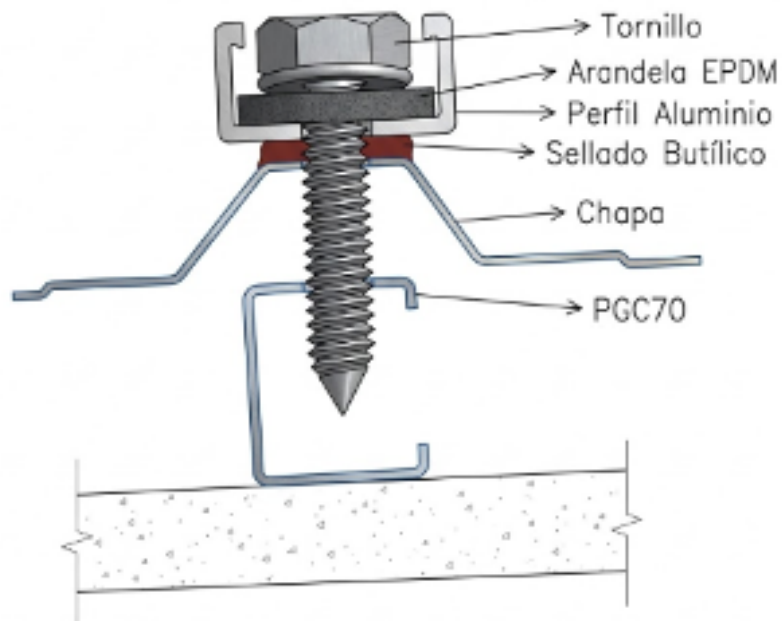

- Cielorraso ranurado 18 mm (existente)
- Tirante de madera 4"x2" (existente)
- 
- a
gotero

