

VOLTIA

Procedimiento General de Trabajo

PGT de Voltia

Cómo trabaja Voltia en su conjunto: por qué etapas pasa cada instalación, qué área se ocupa de cada una, cómo se pasan el trabajo entre ellas y qué reglas valen para todos.

Versión 1.3 · octubre de 2026 · documento interno

PARTE 1

Cómo se conecta Voltia

Los documentos de trabajo, el recorrido de un proyecto y las reglas que valen para todas las áreas.

LOS CAPÍTULOS DE ESTA PARTE

0 Qué es este documento

1 El recorrido de un proyecto

2 Las reglas que valen para todos

CAPÍTULO 0

Qué es este documento

El PGT

Este documento se llama **Procedimiento General de Trabajo**, o **PGT**. Explica cómo trabaja Voltia en su conjunto: por qué etapas pasa cada instalación solar desde que se vende hasta que queda funcionando, qué área de la empresa se ocupa de cada etapa, cómo se pasan el trabajo de un área a otra y qué reglas valen para todos.

El PGT no explica cómo se hace cada tarea. Eso está en el manual de cada área, que se listan más abajo. Por ejemplo: el PGT dice que Ventas acuerda con el cliente cómo va a pagar; **cómo** se carga eso en Voltia PM —el sistema que usamos todos para trabajar— está en el Manual de trabajo de Ventas.

Cómo se lee

Todos los que trabajan en Voltia leen el PGT entero, empezando por acá. Es corto a propósito. Después, cada uno lee **el manual de su área**. Gerencia los lee todos.

Cada manual empieza diciendo quién lo tiene que leer. Si un área necesita saber algo de otra, **eso está repetido en su propio manual**: nadie tiene que salir a buscar pedacitos en los manuales de los demás.

Las palabras que se usan mucho y que alguien nuevo puede no conocer —Voltia PM, UTE, etapa, E1— están explicadas en el **glosario**, al final del PGT.

Los documentos de trabajo de Voltia

DOCUMENTO	QUÉ EXPLICA	QUIÉN LO LEE
Procedimiento General de Trabajo (PGT)	Cómo trabaja Voltia en su conjunto. Es este documento	Todo el equipo
Manual de trabajo de Ventas	Cómo se vende: del primer contacto con el cliente hasta que la venta está cerrada y lista para empezar	Los asesores comerciales y la Gerencia Comercial
Manual de trabajo de Ingeniería	Cómo se proyecta la instalación: el relevamiento, los planos, los cálculos y la lista de materiales	Ingeniería
Manual de trabajo de Operaciones	Cómo se planifica y se hace la obra. Tiene dos partes que también se entregan sueltas: **Obra**, para el capataz y su equipo, y **Logística**, para quien compra y recibe los materiales	Operaciones; el capataz, la parte de Obra; Logística, la suya
Manual de trabajo de Tramitación UTE	Cómo se hace el trámite ante UTE para que la instalación quede habilitada	Tramitación UTE
Manual de trabajo de Experiencia Solar — *Manual de Posventa*	Cómo se acompaña al cliente de punta a punta: qué se le avisa, cuándo y con qué mensaje	Experiencia Solar
Manual de trabajo de Finanzas	Cómo se cobra, se paga y se factura	Finanzas
Manual de trabajo de Gerencia	Las decisiones de fondo de la empresa y por qué se tomaron	Gerencia
Reglamento interno del Área Operaciones	El horario, las horas extra, la conducta, la seguridad, los vehículos y las sanciones. Cada trabajador de Operaciones lo firma	Operaciones; los tercerizados, en lo que les toca

Si dos documentos dicen cosas distintas

Uno de los dos está mal. **Se avisa a Gerencia** y se corrige: los documentos tienen que decir siempre lo mismo.

Las versiones


Arriba de cada documento dice su **versión** y su fecha. Al final de cada uno está el **registro de cambios**: qué se agregó o se modificó en cada versión. Así, quien ya lo leyó sabe qué cambió sin tener que leerlo entero de nuevo.

CAPÍTULO 1

1 El recorrido de un proyecto

Un cliente pasa por **ocho etapas**, desde que hace su primera consulta hasta que su instalación queda **habilitada**: es decir, hasta que UTE la aprueba y el cliente ya puede encenderla y empezar a generar su energía. Cada etapa tiene un área dueña y un **plazo**: cuánto puede durar, en días hábiles (de lunes a viernes, sin contar los feriados no laborables, el Carnaval ni la Semana de Turismo, que Voltia no trabaja). Voltia PM muestra en cada proyecto cuánto le queda a su etapa.

En paralelo, desde que termina el onboarding, **Experiencia Solar acompaña al cliente** en tres tramos:

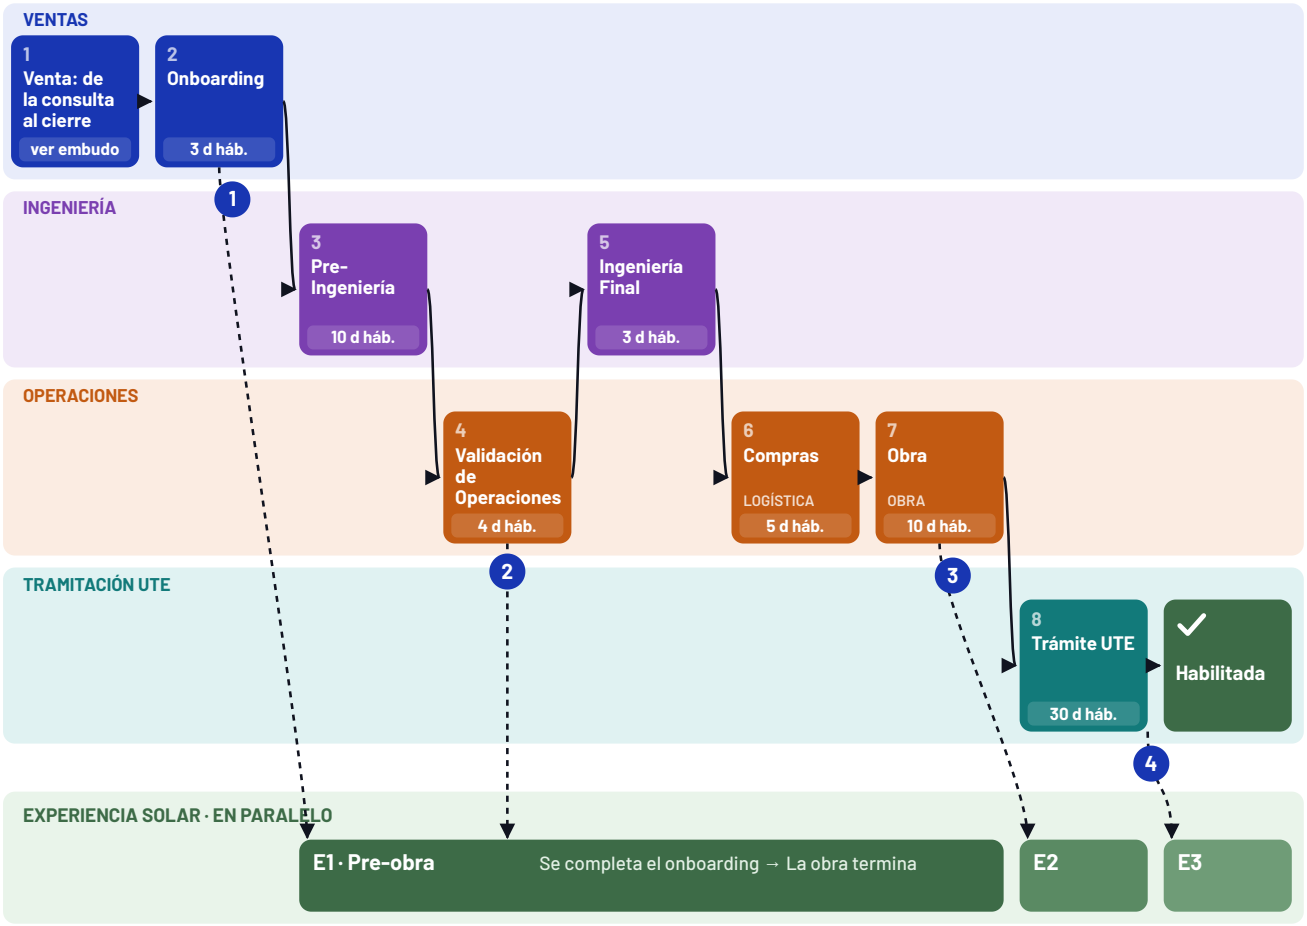

Cuatro momentos conectan las dos líneas:

1. **Se completa el onboarding** → arranca E1.
2. **Se confirma la fecha de obra** → Experiencia Solar se la comunica al cliente.
3. **Termina la obra** → arranca E2.
4. **UTE habilita** → arranca E3.

CAPÍTULO 2

2 Las reglas que valen para todos

Regla 1 — Solo dos personas hablan con el cliente

El capataz asignado a la obra y Experiencia Solar. Nadie más.



NO HABLAN CON EL CLIENTE: LE PIDEN A UNO DE LOS DOS

Ventas (después del onboarding) · Ingeniería · Gerente de Operaciones · Logística · Tramitación UTE

El vendedor deja de ser el contacto cuando termina el onboarding. Ni el gerente de Operaciones, ni Logística, ni Ingeniería, ni Tramitación contactan al cliente. Quien necesita coordinar algo con él se lo pide a una de esas dos personas.

Regla 2 — Nunca se le devuelve el organigrama al cliente

Decirle *«eso lo tenés que hablar con el capataz»* o *«ese tema es de Ingeniería»* es explicarle cómo estamos organizados por dentro. **No le sirve: él contrató a Voltia, no a un área.**

Si pregunta algo que no le corresponde a quien lo atiende, la respuesta es **«te averiguo y te confirmo»**, y se resuelve puertas adentro. **El cliente nunca es el mensajero de Voltia.**

Regla 3 — Si una etapa se atrasa, el área avisa por qué

Cuando un área ve que su etapa se va a demorar, **lo deja escrito en su módulo de Voltia PM, con el motivo**, sin esperar a que alguien le pregunte. Así cualquiera que mire el proyecto sabe qué pasa, y nadie tiene que salir a averiguarlo.

Si el atraso mueve una fecha que ya se le dio al cliente, **la fecha se cambia en el calendario.** Eso le avisa a Experiencia Solar, que es quien se lo cuenta al cliente.

Regla 4 — La fecha de obra confirmada se defiende

Mover una fecha confirmada es la excepción, no el camino normal.

Si una etapa se atrasa y pone en riesgo una fecha de obra ya confirmada, **primero se busca cómo recuperar el tiempo**: darle prioridad a ese proyecto, horas extra, comprar en plaza, adelantar en paralelo lo que se pueda. La fecha se mueve solo cuando no hay forma, y nunca a costa de la calidad o la seguridad.

Cada fecha que se mueve **rinde cuentas**: queda registrado qué etapa se atrasó, de qué área, cuántos días y qué se intentó para no moverla. Lo explica **el área que se atrasó**, no Operaciones, que es la que recibe el atraso. Lo que no depende de Voltia (la lluvia, un cambio que pide el cliente, una demora de UTE) se registra igual, pero no cuenta como atraso de un área. **Gerencia lo revisa una vez por mes.**

No es para buscar culpables. Cada fecha que se mueve es plata: una cuadrilla que estaba organizada, una vuelta más a la casa del cliente y la obra de otro cliente que no se hizo. Rendir cuentas es explicar qué pasó y qué se cambia para que no se repita.

Regla 5 — Todo se registra donde ya se está trabajando

Si hay que preguntarle a alguien en qué anda algo, es porque falta un registro.

Cada área registra en **su módulo** de Voltia PM, el que usa para trabajar, con las vistas que le sirven. No hay que entrar al módulo de otra área. Por detrás, la ficha del cliente es una sola: lo que registra cada área aparece en el historial del cliente, con el nombre del área, y lo ven todos.

Regla 6 — Si no está agendado, no vamos

Ninguna visita a la propiedad del cliente sin que esté en el calendario y avisada. Vale para el relevamiento, para la visita técnica de coordinación, para dejar materiales y para la obra. Y si está agendada y no se puede ir, **se avisa antes de la hora**.

Regla 7 — Toda reprogramación se avisa el mismo día

Si una fecha que ya se le dio al cliente se mueve, **se le avisa ese mismo día, con el motivo**, aunque todavía no haya fecha nueva.

Regla 8 — Habilitación: de 24 a 48 horas

Cuando UTE habilita, el cliente tiene que saber **en 24 a 48 horas** que ya puede encender. Cada día que pasa sin saberlo, deja de ahorrar.

Regla 9 — Reclamos: respuesta el mismo día hábil, siempre

Aunque sea «lo estoy viendo, te confirmo mañana». **La solución puede demorar; la respuesta no.**

Regla 10 — Todo mensaje al cliente cierra con el próximo paso

Nunca un mensaje que lo deje sin saber qué sigue: «ahora arranca el trámite, y te aviso apenas habiliten».

PARTE 2

Las áreas y cómo trabajan juntas

Qué hace cada área, qué le deja a la siguiente y a quién se le pregunta qué.

LOS CAPÍTULOS DE ESTA PARTE

3 Las áreas

4 Cómo se pasa el trabajo de un área a otra

5 A quién se le pregunta qué

CAPÍTULO 3

3 Las áreas

Qué hace cada una a grandes rasgos y dónde termina su trabajo. El detalle, en su manual.

Ventas

Vende, cierra la venta con el cliente y deja todo listo para empezar: el contrato, la seña, cómo va a pagar y la consulta inicial a UTE

TERMINA Cuando el onboarding está completo y el cliente sabe cómo sigue

Ingeniería

Con lo que trajo la visita de venta —el resumen, las fotos y los videos— diseña la instalación, con planos y cálculos, y arma la lista de materiales. Después de que Operaciones la revisa, la ajusta en la Ingeniería Final

TERMINA Cuando la lista de materiales está cerrada y no se toca más

Operaciones

Valida lo que proyectó Ingeniería, confirma la fecha de obra, planifica, ejecuta la instalación y controla los costos. Después hace los mantenimientos y las visitas de soporte

TERMINA Cuando la obra está terminada y toda la documentación está cargada

Obra (el capataz)

Lleva adelante la instalación en la propiedad y habla con el cliente de lo del día

TERMINA Cuando deja cargado todo lo necesario para cerrar la obra

Logística

Compra los materiales de la lista definitiva, sigue los pedidos y los recibe en depósito

TERMINA Cuando el material está en depósito y la obra se puede planificar

Tramitación UTE

Hace el trámite ante UTE paso a paso, desde la primera consulta hasta que UTE habilita la instalación

TERMINA Cuando UTE habilita

Experiencia Solar

Acompaña al cliente desde que termina el onboarding hasta mucho después de que enciende: es su referente

TERMINA No termina

Finanzas

Cobra a los clientes según el plan de pagos, paga a proveedores, instaladores y comisiones, emite las facturas y lleva los resultados

TERMINA Cuando el proyecto está cobrado entero y sus gastos pagados

Gerencia

Define los criterios y las decisiones estratégicas, conduce la reunión de coordinación y atiende el escalamiento

TERMINA No termina: responde por el conjunto

Experiencia Solar, como el médico de cabecera: el especialista le habla directo al paciente, pero el médico de cabecera tiene la historia completa y responde por cómo va todo. Por eso las demás áreas no tienen que pasar por ella para todo, pero sí tienen que dejar registrado lo que hacen (regla 5).

Ventas

Qué hace. Todo el camino comercial: desde que una persona escribe preguntando por una instalación solar hasta que la venta está cerrada y el proyecto, listo para empezar.

De dónde vienen las consultas. De **Marketing**: el contenido, las redes sociales y la publicidad en redes hacen que la gente escriba. Esas consultas les llegan a los asesores comerciales. Marketing depende de Gerencia y no tiene manual propio.

El embudo de ventas. No todas las consultas terminan en una venta: en cada paso hay gente que no sigue. De cada 100 consultas que llegan se cierran, más o menos, 2 ventas.



Cada paso queda registrado en el **pipeline comercial** de Voltia PM. Qué pasa en cada uno y sus plazos están en el Manual de trabajo de Ventas.

Cuando el cliente confirma. El asesor marca el lead como **ganado** en Voltia PM, y eso crea el proyecto solo, con todos los datos del lead, incluidos los archivos adjuntos.

El onboarding. Es la primera etapa del proyecto, y también la hace el asesor: confirma la venta por escrito, firma el contrato, cobra la seña, define con el cliente cómo va a pagar, junta los datos para empezar, presenta la consulta inicial a UTE y le da al cliente una estimación de obra por quincena, que no es una fecha. Las tareas una por una están en el Manual de trabajo de Ventas.

La última tarea del onboarding es **presentarle al cliente a quien va a ser su referente de ahora en adelante**: el responsable de Experiencia Solar. Cuando el onboarding está completo pasan dos cosas: el proyecto pasa a **Ingeniería** y el cliente entra en la **etapa 1 de Experiencia Solar** (E1). Desde ahí, la etapa deja de ser de Ventas.


El onboarding no se cierra sin saber cómo y cuándo paga el cliente. Si paga directo, el asesor deja armado el **plan de pagos**, que dice cuánto se cobra en cada momento de la obra (no en una fecha); si va con **financiación bancaria**, la **proforma** para el banco; si es un caso particular, la explicación escrita de lo que se acordó. Sin eso el proyecto no avanza. Al crear el proyecto, el asesor también deja dicho **qué se le factura** al cliente: todo el presupuesto u otro monto, con el motivo.

Después del onboarding. El asesor sigue el cobro, para que no quede en una zona gris sin que nadie lo mire: si va con financiación bancaria, sigue el trámite con el banco hasta que salga.

La comisión. El asesor cobra una comisión por cada venta que cierra.

Ingeniería

Qué hace. Diseña la instalación con lo que trae la visita de venta, que al ganar el lead pasa al proyecto.

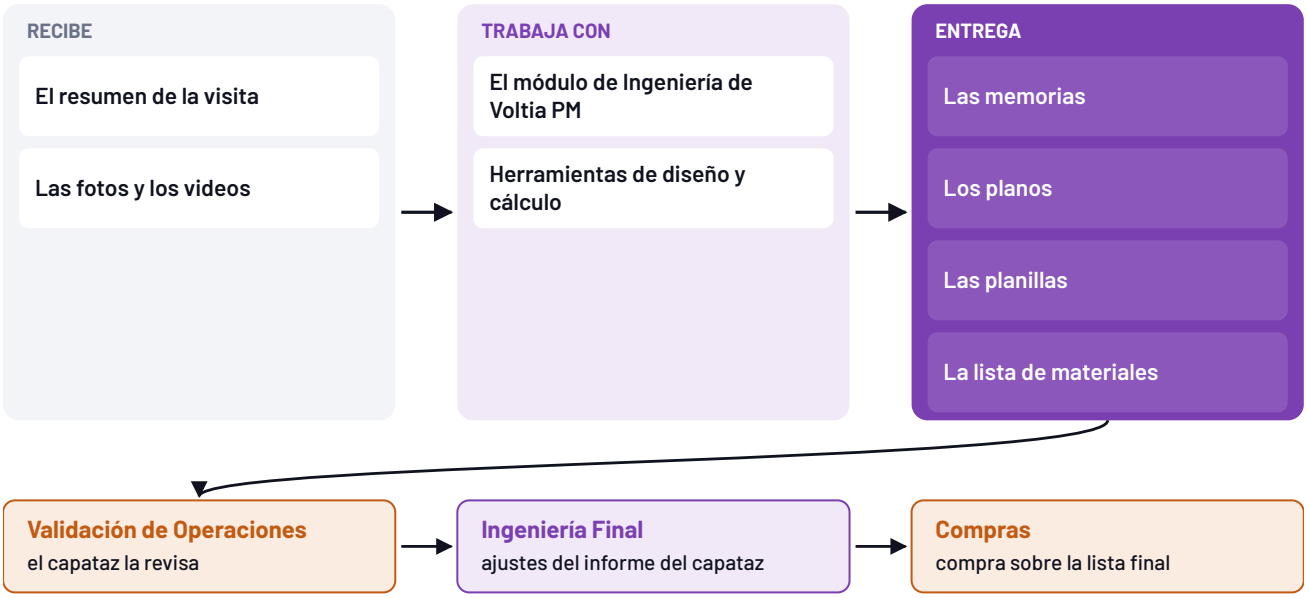

Qué recibe.

- **El resumen de la visita**, con lo que se habló y el relevamiento técnico.
- **Las fotos y los videos** de la visita, que quedan cargados en el lead.

Con qué trabaja.

- **El módulo de Ingeniería de Voltia PM**, con las herramientas para diseñar la instalación.
- **Herramientas de diseño y cálculo**, con los criterios que definió Voltia para hacer la ingeniería. Cuáles son y cómo se usan está en el Manual de trabajo de Ingeniería.

Qué entrega.

- **Las memorias:** la descriptiva y la de cálculo.
- **Los planos.**
- **Las planillas** de verificación estructural y de vuelco.
- **La lista de materiales.**

Dos pasadas. La pre-ingeniería —con los planos y la lista de materiales— va **primero a Validación de Operaciones**, no a Compras. Cuando Operaciones la valida, vuelve a Ingeniería para la **Ingeniería Final**: ahí se hacen los ajustes que marcó el capataz y se confirma toda la documentación. **Recién esa lista final va a Compras.**

Operaciones

Operaciones tiene tres momentos en el recorrido: la **Validación**, las **Compras** (Logística) y la **Obra**. Y sigue después del recorrido: los **mantenimientos** y las **visitas de soporte** los coordina Experiencia Solar con el cliente y los hace Operaciones.



Operaciones es el área más crítica, porque es el centro de la cadena: todo gira alrededor de la obra. Todo lo que otra área no hace en tiempo y forma le cae a la obra: una venta sin cobrar, una ingeniería sin terminar o un material que no llegó son una obra que no se puede arrancar; una coordinación mal hecha con el cliente es un día perdido o una vuelta más. Y cada obra que se mueve, mueve toda la agenda. **Cada atraso es plata:** lo que cuesta la vuelta de más, y lo que se dejó de hacer mientras tanto. Por eso **Operaciones necesita, sí o sí, que todas las demás áreas cumplan sus plazos.**

La Validación de Operaciones. Recibe la pre-ingeniería con los planos y la lista de materiales, y revisa si falta algo para poder hacer la obra sin problemas. Validan dos personas, en este orden, apenas el proyecto llega de Ingeniería:

1. **El gerente de Operaciones** confirma la **fecha de obra** en el calendario. Recién ahí **Experiencia Solar se la avisa al cliente**.
2. **El capataz** del equipo que tiene la obra revisa la pre-ingeniería, en 2 días hábiles, y deja su **informe**, que es lo que usa Ingeniería en la Ingeniería Final.

Al cliente la fecha de obra se le dice una sola vez: cuando ya se sabe. Decirle una fecha y después otra confunde y le saca confianza. Al vender, Ventas le da solo una estimación por quincena, que no es una fecha.

Lo que deja la Validación es **la fecha de obra confirmada** y, si hace falta, **el informe del capataz.** Después el proyecto **vuelve a Ingeniería** para la Ingeniería Final.

Desde que el proyecto entra a Validación hasta la obra pasan, como mínimo, 12 días hábiles, porque cada área trabaja después de la otra: Validación 4, Ingeniería Final 3 y Compras 5. Por eso la fecha de obra nunca puede quedar antes, y **un día de atraso en cualquiera de esas etapas es un día más de obra**. Por eso también, **una vez confirmada, la fecha de obra se defiende** (regla 4): ante un atraso, primero se busca recuperar el tiempo, y moverla es la excepción.

Las Compras. Las hace Logística, y su único punto de partida es **la lista de materiales de la Ingeniería Final**, que ya pasó por el capataz. Lo que entrega es **la lista de materiales lista para salir a obra**:

- **Si la obra la hace el equipo propio**, la preparación de los materiales para salir a obra la hace el capataz. Compras tiene que asegurarse de que, para el día de la preparación, **esté todo en el local**.
- **Si la obra la hace un instalador tercerizado**, Compras arma el **kit de materiales**, coordina el **flete** y se lo manda.

La Obra. El equipo de obra recibe los materiales y la ingeniería, y hace la instalación. Lo que entrega es **la obra terminada**, con todo lo necesario para darla por cerrada: los controles de obra finalizada cumplidos y los documentos firmados, cargados en Voltia PM. El detalle de qué hace falta para cerrar una obra está en el Manual de trabajo de Operaciones.

Al terminar cada obra, el gerente de Operaciones hace el **informe post-obra**: evalúa cómo trabajó cada área que intervino (Ingeniería, Compras y Logística, Operaciones), con sus errores, sus aciertos y qué se corrige, y se lo notifica a cada responsable, que lo firma. Lo recibe el CEO.

Tramitación UTE

Qué hace. El trámite ante UTE para que la instalación quede habilitada. Es la etapa donde el cliente ya tiene los paneles instalados y **todavía no los puede usar**, y donde la demora no depende de Voltia: por eso cada hito que se marca importa, porque es lo único que se mueve mientras el cliente espera.

Los pasos del trámite. El trámite avanza por hitos, y cada uno se marca en Voltia PM cuando ocurre; el cliente ve los mismos en el portal de Voltia. A grandes rasgos son cuatro pasos:



Los hitos uno por uno están en el Manual de trabajo de Tramitación UTE.

La consulta la presenta Ventas en el onboarding; desde ahí, el trámite lo sigue Tramitación. Si UTE contesta la consulta con menos potencia que la pedida, la respuesta la da **Ingeniería**, que es quien puede justificar con números el consumo que va a tener el cliente. **Cuando UTE habilita**, Tramitación marca el trámite como finalizado y Voltia PM le avisa solo a Experiencia Solar, que tiene de 24 a 48 horas para decirle al cliente que ya puede encender.

Experiencia Solar

Qué hace. Acompaña al cliente desde que termina el onboarding hasta mucho después de que enciende: es su **referente**, la persona a la que le escribe. Para acompañarlo necesita saber en qué está todo, y por eso las demás áreas dejan registrado lo que hacen.

Las tres etapas del cliente. No son las etapas del proyecto: son las que vive el cliente.

E1
Pre-obra
Se completa el onboarding → La obra termina

Expectativa y ansiedad: compró algo que todavía no existe

E2
Habilitación
La obra termina → UTE habilita

La etapa más difícil: tiene los paneles en el techo y no los puede usar

E3
Post-habilitación
UTE habilita → Para siempre

Está generando, y ahora necesita entender lo que ve

Cada cuánto se le habla. En E1 y E2, si un cliente pasa **una semana de trabajo** sin un contacto registrado, Voltia PM lo marca. En E3 no hay plazo fijo, porque esa etapa no termina nunca: el contacto lo dan el reporte mensual de generación, la encuesta de aniversario y el mantenimiento, y el cliente vuelve a aparecer si pasa algo.

Los avisos que no se pueden fallar. La bienvenida, la fecha de obra, toda visita a la propiedad, la obra terminada y qué sigue, y «**ya podés encender**», de 24 a 48 horas después de la habilitación, junto con la capacitación.

Todo el detalle está en el Manual de trabajo de Experiencia Solar (Manual de Posventa).

Finanzas

Qué hace. Cobra a los clientes según el plan de pagos que dejó armado Ventas, cada cuota cuando llega su momento de la obra, paga a los proveedores, a los instaladores y las comisiones, emite las facturas por lo que dejó definido Ventas y lleva los resultados de la empresa. Si una cuota vence sin pagarse, el reclamo al cliente lo hace Experiencia Solar, que es quien habla con él; está decidido que pase al área de Administración cuando esa área tome Finanzas. Su trabajo con un proyecto termina cuando está cobrado entero y sus gastos, pagados. El detalle está en el Manual de trabajo de Finanzas, que está en armado.

Gerencia

Qué hace. Define los criterios y las decisiones de fondo de la empresa, conduce la reunión de coordinación entre áreas y atiende los casos que el cliente le lleva por encima de su referente. También lleva **Marketing**: el contenido, las redes sociales y la publicidad que generan las consultas. Los criterios y las decisiones, con su porqué, van en el Manual de trabajo de Gerencia.

CAPÍTULO 4

4 Cómo se pasa el trabajo de un área a otra

Cuando un área termina lo suyo, **completa su etapa en Voltia PM y el trabajo pasa solo al área siguiente**, que recibe un aviso. No hace falta mandar un mensaje avisando.

Lo que importa es **qué deja cada una para la siguiente**, porque si falta, la otra arranca a ciegas:

DE	A	QUÉ LE DEJA
Ventas	Ingeniería	Todo lo de la visita cargado en el proyecto: el resumen, la minuta, las fotos y los videos
Ventas	Experiencia Solar	El cliente **presentado**: el asesor le presenta al responsable de Experiencia Solar antes de que este le escriba
Ingeniería	Operaciones	La pre-ingeniería, con la lista de materiales preliminar, para validar, y los datos de la instalación ya definidos y coincidiendo en la pre-ingeniería y el unifilar: cuántos paneles, el inversor, si es monofásica o trifásica, sobre qué techo va y si los paneles van coplanares o inclinados. Sin esos datos, la Pre-Ingeniería no se da por terminada
Operaciones	Ingeniería	El informe del capataz, si hay algo que cambiar, para la Ingeniería Final
Ingeniería	Logística	La lista de materiales de la Ingeniería Final, ya revisada por el capataz
Operaciones	Experiencia Solar	La fecha de obra confirmada **en el calendario**: el aviso le llega solo
Logística	Obra	Los materiales listos para salir a obra: todo en el local o, si la obra es tercerizada, el kit enviado
Obra	Experiencia Solar	La obra terminada: el aviso llega solo, arranca E2 y Experiencia Solar le cuenta al cliente qué sigue
Obra	Tramitación UTE	La documentación de obra firmada, las fotos y los videos de los ensayos, cargados en el proyecto

DE	A	QUÉ LE DEJA
Tramitación UTE	Experiencia Solar	La habilitación marcada: el aviso le llega solo y arranca el reloj de 24 a 48 horas

Cuatro cosas que se avisan solas, sin que nadie escriba: **la fecha de obra confirmada, cada reprogramación (con su motivo), la obra terminada y la habilitación.** Todas le llegan a Experiencia Solar, que es quien se las cuenta al cliente.

CAPÍTULO 5

5 A quién se le pregunta qué

Dos reglas, según qué se busca:

- **Una consulta de información** (qué se prometió, si hay stock, algo del plano) se le hace **directo a quien la tiene.**
- **Un reclamo o una corrección** (algo mal hecho, algo que falta, una demora que afecta al cliente) va **al gerente del área, no a la persona que está ejecutando.**

Y en ningún caso el cliente hace de mensajero.

SI HACE FALTA SABER…	SE LE PREGUNTA A…
Qué se le prometió al cliente en la venta: alcance, plazos, condiciones	Al **asesor comercial** del proyecto. No hay responsable de ventas: cada proyecto tiene el suyo
Si entró la seña, cómo se le cobra, cómo se registra un gasto	Finanzas
Qué quincena de obra se le puede estimar al cliente, cuándo se puede ir a relevar	Gerente de Operaciones
Algo del plano o del paquete técnico	Ingeniería
Si hay stock, si está el material en depósito, si la lista está cerrada	Logística (y la lista, a Ingeniería)
Que se corrija algo de la instalación, o documentación de obra que falta	**Gerente de Operaciones — nunca al capataz**
Cómo responder una observación de UTE	Ingeniería
Algo del cliente que no es de obra	Experiencia Solar

PARTE 3

El cliente y Voltia PM

Lo que todas las áreas tienen que saber del trato con el cliente, la herramienta y qué hacer cuando algo sale mal.

LOS CAPÍTULOS DE ESTA PARTE

6 El cliente

7 Voltia PM

8 Cuando algo sale mal

CAPÍTULO 6

6 El cliente



Todo lo que se le dice al cliente, cuándo y con qué mensaje está en el **Manual de trabajo de Experiencia Solar**.

CAPÍTULO 7

7 Voltia PM

Voltia PM es la herramienta interna. Tres nombres que no se mezclan: **Voltia PM** (la herramienta), **el portal de Voltia** (lo que ve el cliente) y **la aplicación del inversor** (la generación en vivo). Nunca "la app" a secas.

Se entra con el **mail o con el usuario corto**, una versión corta del nombre. Quien no sabe cuál es el suyo se lo pregunta a Administración.

El menú tiene una sección por cada área —Ventas, Ingeniería, Proyectos, Calendario, Experiencia Solar, Trámites UTE— y **Mis tareas**, con lo que cada uno tiene pendiente.


Dos cosas valen para todas las áreas:

- **Cada área registra en su módulo.** Por detrás la ficha del cliente es una sola, y todo llega a su historial con el nombre del área.
- Desde un proyecto se puede saltar **al mismo cliente** en las otras secciones, sin tener que buscarlo de nuevo.

En el **menú del usuario**, arriba a la derecha, está **Capacitación**: videos y documentos para aprender a usar Voltia PM, divididos por área.


Las pantallas que usan todos

El proyecto. Donde se sigue cada obra: sus etapas, en qué está y cuánto le queda a la etapa en curso.

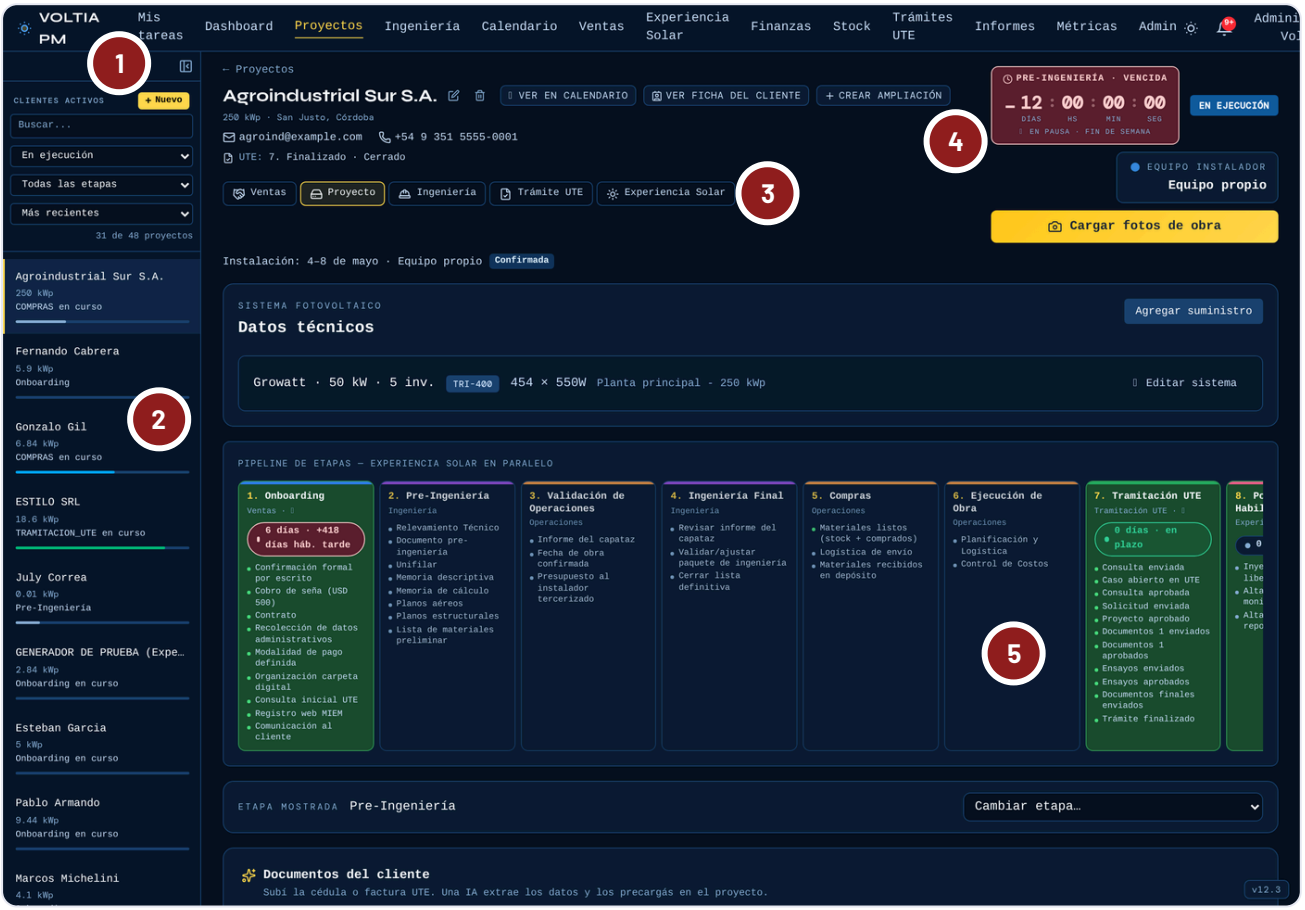


1. El menú, con una sección por área
2. La lista de clientes, para elegir con cuál trabajar
3. Los botones que llevan al mismo cliente en otras secciones
4. El plazo de la etapa en curso, en cuenta regresiva
5. El recorrido del proyecto, etapa por etapa

La ficha del cliente. La pantalla de Experiencia Solar: los datos del cliente, sus tres etapas y todo su historial, con lo que registró cada área.

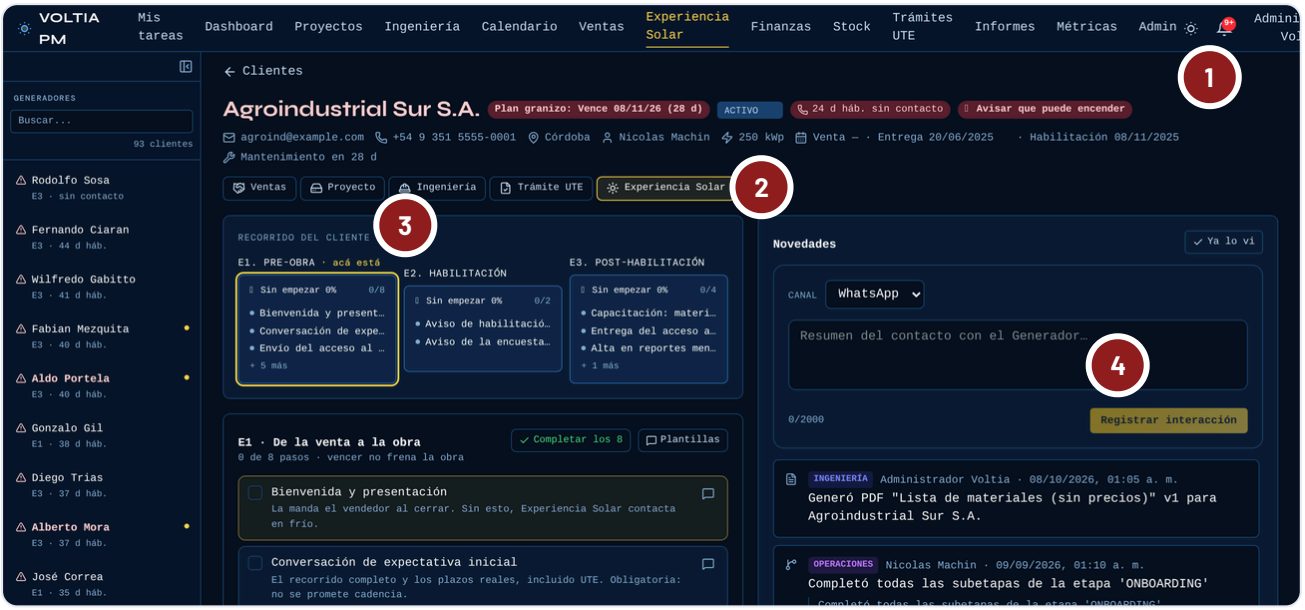


1. Los datos del cliente y cuántos días hace que no se lo contacta
2. Los botones que llevan al mismo cliente en otras secciones
3. Sus tres etapas, con los pasos de cada una
4. Para registrar un contacto; debajo, todo el historial

El calendario. Donde se agenda todo lo que ocupa a alguien —las obras, las visitas, los mantenimientos—, cada cosa con su color.

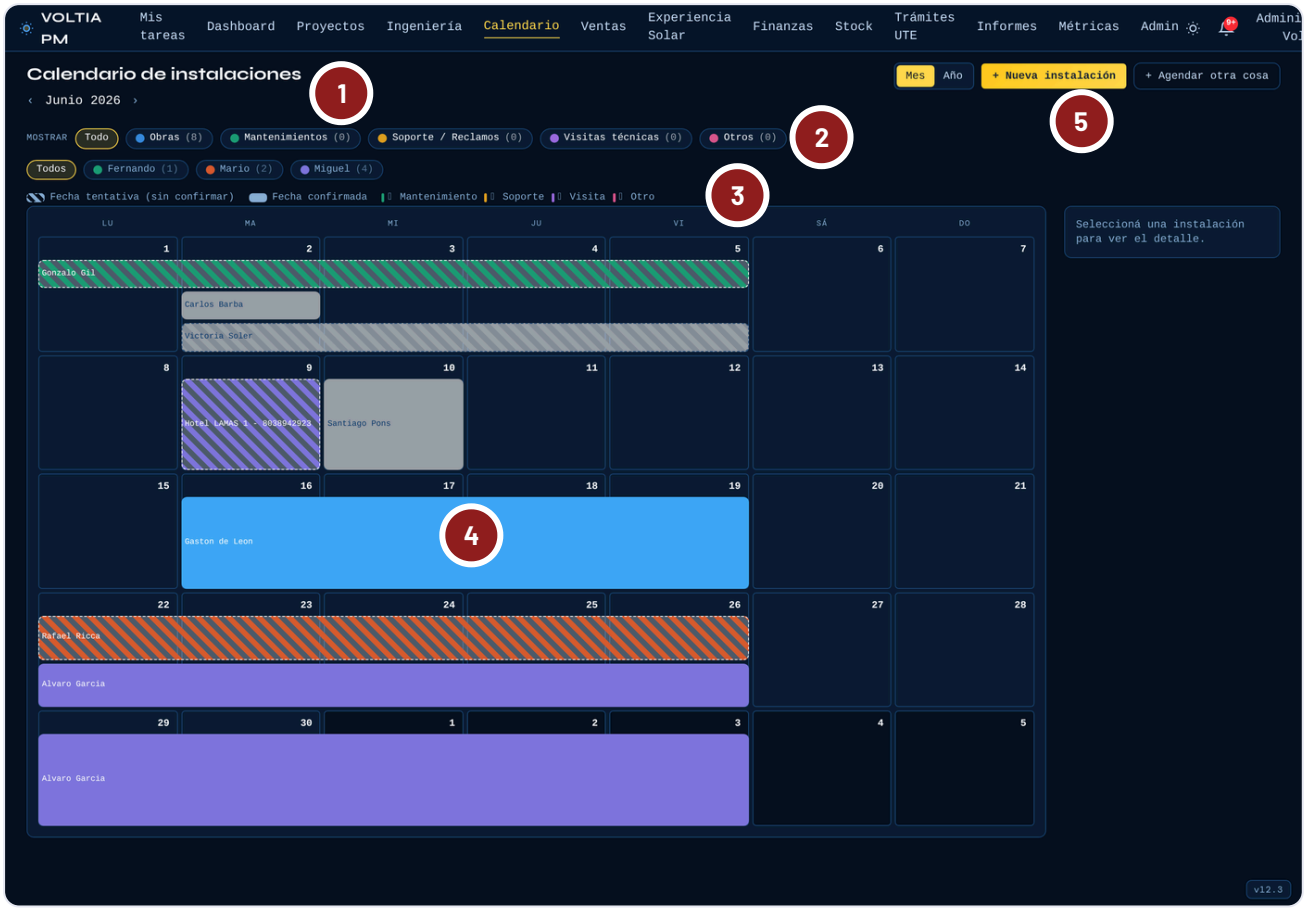

1. El mes, con flechas para ir y venir
2. Qué mostrar: obras, mantenimientos, visitas…
3. Rayado, fecha tentativa; lleno, fecha confirmada
4. Cada obra agendada, del color de su equipo
5. Para agendar una obra u otra cosa

El portal de Voltia. Lo que ve el cliente: el avance de su trámite paso por paso, sus reportes, sus reclamos y sus encuestas.

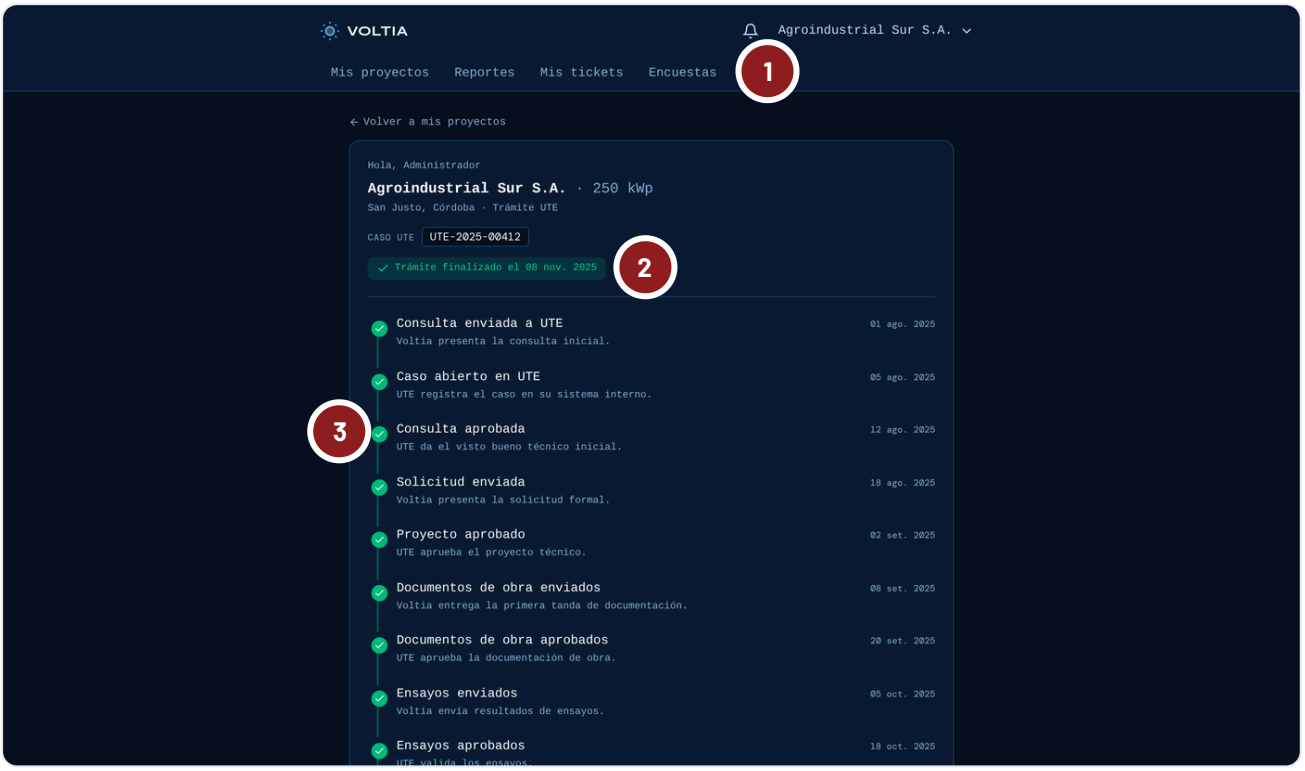

1. Lo que el cliente puede abrir: proyectos, reportes, reclamos y encuestas
2. En qué está su trámite
3. Cada paso del trámite, con su fecha

Cómo se usa cada pantalla está en el manual del área que la usa.

CAPÍTULO 8

8 Cuando algo sale mal

⚠ Se vence un plazo.

Nada se frena: la etapa sigue. Quien la tiene la termina lo antes posible y, si la demora va a seguir, deja escrito por qué. Lo que no se hace es marcar una tarea como hecha para que deje de figurar vencida.

⚠ Falta algo para poder avanzar.

Un dato de la venta, una firma, un material. Se le pide por Voltia PM al área que lo tenía que dejar, y si no aparece, a su gerente. No se arranca a ciegas ni se resuelve por fuera.

⚠ El cliente le escribe a alguien que no es su referente.

Se le responde «te averiguo y te confirmo» y se le pasa a Experiencia Solar. No se lo deriva ni se le promete nada que no se sabe si se cumple.

⚠ Hay que cambiar algo que ya se le prometió al cliente.

Una fecha, el alcance, una condición. Se decide adentro, se registra, y Experiencia Solar se lo cuenta el mismo día. El cliente nunca se entera en la obra.

⚠ Un problema se repite.

Se lleva a la reunión de coordinación. Lo que se cambia es cómo se trabaja, no se busca a quién culpar.

ANEXO

Las reglas en una página

01 **Solo el capataz y Experiencia Solar hablan con el cliente.**
Quien necesita coordinar algo con él se lo pide a uno de los dos.

02 **Nunca se le devuelve el organigrama al cliente.**
«Te averiguo y te confirmo», y se resuelve puertas adentro.

03 **Si una etapa se atrasa, el área avisa por qué.**
Y si mueve una fecha que ya se le dio al cliente, se cambia en el calendario.

04 **La fecha de obra confirmada se defiende.**
Moverla es la excepción: primero se busca recuperar el tiempo, y cada cambio rinde cuentas.

05 **Todo se registra donde ya se está trabajando.**
Si hay que preguntar en qué anda algo, falta un registro.

06 **Si no está agendado, no vamos.**
Y si está agendado y no se puede ir, se avisa antes de la hora.

07 **Toda reprogramación se avisa el mismo día.**
Con el motivo, aunque todavía no haya fecha nueva.

08 **Habilitación: de 24 a 48 horas.**
Cada día que pasa, el cliente deja de ahorrar.

09 **Reclamos: respuesta el mismo día hábil, siempre.**
La solución puede demorar; la respuesta no.

10 **Todo mensaje al cliente cierra con el próximo paso.**

ANEXO

Glosario

PALABRA	QUÉ ES
Voltia PM	El sistema interno que usamos todos para trabajar: ahí están los proyectos, los clientes, el calendario y todo lo que cada área registra.
UTE	La empresa estatal de electricidad. Para que un cliente genere su propia energía conectado a la red, UTE tiene que aprobar la instalación y habilitarla.
Área	Cada sector de Voltia: Ventas, Ingeniería, Operaciones, Tramitación UTE, Experiencia Solar, Finanzas y Gerencia.
Generador	El cliente, una vez que su instalación existe. Es como lo llama UTE y como lo llama Voltia PM.
E1 / E2 / E3	Los tres tramos del acompañamiento al cliente. **No son las etapas del proyecto.**
Onboarding	La segunda etapa del proyecto: después de cerrar la venta, el asesor firma el contrato con el cliente, cobra la seña, define cómo va a pagar y junta los datos para empezar.
Etapa	Cada uno de los ocho tramos del proyecto, de Venta a Trámite UTE.
Subetapa	Las tareas dentro de una etapa, con su checklist.
Traspaso	El pase de trabajo de un área a la siguiente. Lo genera Voltia PM al completarse una etapa.
Paso	Un aviso al cliente dentro del recorrido de Experiencia Solar. Algunos tienen plazo; **vencer no bloquea**.
Cadencia	Cuánto tiempo puede pasar un cliente sin contacto antes de que Voltia PM lo marque. Vale para E1 y E2; **E3 no tiene**, porque no termina nunca y marcaría a todos para siempre.
Novedad	Pasó algo en el proyecto después del último contacto: el cliente todavía no lo sabe.
Ticket	Un reclamo o consulta registrado, con estado y responsable.

PALABRA	QUÉ ES
Portal de Voltia	Lo que ve el cliente: avance, documentación, reportes, tickets y encuestas.
Reunión de coordinación	Donde se trata lo que está fuera de plazo entre áreas.

ANEXO

Registro de cambios

VERSIÓN	FECHA	QUÉ SE AGREGÓ O MODIFICÓ
1.3	22 de octubre de 2026	Las cuotas del plan de pagos se cobran cuando llega cada momento de la obra, no en una fecha fijada de antemano. Al crear el proyecto, Ventas deja dicho qué se le factura al cliente, y Finanzas factura eso.
1.2	17 de octubre de 2026	Se aclara qué es un día hábil: de lunes a viernes, sin feriados no laborables, Carnaval ni Semana de Turismo.
1.1	14 de octubre de 2026	En el traspaso de Ingeniería a Operaciones se suman los datos de la instalación (paneles, inversor, red, techo y si van coplanares o inclinados), coincidiendo en la pre-ingeniería y el unifilar: la Pre-Ingeniería no se da por terminada sin ellos.
1.0	12 de octubre de 2026	Primera versión aprobada. De los borradores anteriores no hay registro de cambios.



VOLTIA
